Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião e acompanhamento

Comissão Viária Estrada das Três Meninas

25 de setembro de 2026

Guia de validação com a comissão + encaminhamento à EPTC

Caminho escolhido: protocolar com a evidência já disponível — sinistros, série da sonda e documentação oficial — e solicitar à EPTC os dados e a vistoria técnica que a comunidade não tem condições de produzir. Coleta física e questionário permanecem em espera por falta de mobilização e **não são condições do protocolo**.

1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** memorando institucional · rascunho de ofício · anexo de pontos.
- **Para abrir a reunião:** linha do tempo documental — uma página que mostra o que a cidade já pactuou, projetou e declarou no eixo da Três Meninas, e o que ficou parado. Boa forma de nivelar a comissão antes das decisões.
- **Técnico:** mapa dos pontos · matriz dos pontos (8 + P9) · avaliação das soluções · base de sinistros.
- **Evidência em consolidação:** sonda de tempos (14 rotas, dados brutos privados; agregar antes de circular) · capturas do trânsito típico · acompanhamento das LAIs.
- **Referências para a vistoria técnica:** plano de coleta · roteiro · ficha CSV.

2. Decisões da comissão (checklist)

- ☒ **Lista de pontos** decidida (13/08): **P1–P8 + novo P9** (entroncamento Rua Santuário × Av. Oscar Pereira); o antigo P9 (rótula Cristiano Kraemer × Juca Batista) foi retirado.
- ☒ **Grafia** "Estr. Cristiano **Kraemer**" — confirmada pela comissão.
- ☒ **Peças aprovadas** (13/08): assina **Eduardo de Oliveira Horta (representante)** pela **Comissão Viária Estrada das Três Meninas**; contato **comissao.viaria@outlook.com**.
- ☒ **D2 (retorno) e D3 (capacidade da Cristiano Kraemer): incluídas** nas peças em versão genérica (decisão 13/08).
- ☒ **P9 atual:** Rua Santuário × Av. Oscar Pereira; pin incorporado em 14/08. A referência antiga permanece apenas no histórico de D4.
- ☒ **Protocola:** Eduardo. **Canal:** SMAMUS (principal), com cópia à EPTC/SMMU e às Subprefeituras Centro-Sul e Glória.
- ☐ **Confirmar o encaminhamento:** protocolo baseado em sonda, sinistros e LAIs, com pedido explícito de dados e vistoria técnica da EPTC; coleta comunitária e questionário ficam em espera.

3. Consolidação atual — 25/09/2026

- **Ata em preparação pela comissão**, conforme atualização recebida em 25/09. Incorporar quando disponibilizada; não presumir deliberações ou protocolo já realizado.
- **Sonda:** 8.582 medições em 14 rotas até 01/09. Usar tempos estimados e assimetrias direcionais, com janelas explícitas, sem atribuir causalmente a diferença R05/R06 à alça.
- **Sinistros:** base EPTC principal e Dados Abertos POA auxiliar, ambas sem filtro de vítimas. Reconciliação por ID na mesma janela disponível.
- **LAIs:** 30 pedidos; acompanhar as respostas de 20/23/24/25/26/27/28/29/30 (o 14 venceu sem resposta e foi refeito no 27; as peças restantes do 16 foram pedidas no 26) no registro. O 21 foi respondido em 16/09; o 19 em 14/10, em parte (três pareceres de empreendimentos na Cristiano Kraemer, sem o quarto processo); o 22 (DMAE, drenagem) em 06/10, sem registro de novo andamento desde 2020, e por isso foi feito o 25 à CTAAPS; o 18 foi respondido em 02/10 sem localizar o depósito da Cláusula Nona e remetido à SMAMUS (Pedido 24, protocolado no mesmo dia). Pedidos 9 e 10 já foram protocolados e respondidos; não repetir o encaminhamento antigo.
- **Documentos:** parcelas do P7 reconciliadas por decreto/processo; a faixa da Três Meninas 1085 fica junto à Florestan Fernandes, no eixo P6. Manter separadas aprovação, vigência do projeto, desapropriação e execução física.
- **Peças:** conferir número/data do ofício e comprovação do protocolo principal. O gate automático deve ser acompanhado da leitura factual e da inspeção visual do PDF.

4. Mínimo suficiente para protocolar na EPTC

Protocolar quando os requisitos formais abaixo estiverem cumpridos. A ausência de coleta física ou questionário não impede o pedido, que busca justamente a vistoria e os dados da autoridade competente.

- ☐ **Base indicativa consolidada:** sinistros, agregados metodologicamente descritos da sonda e respostas LAI — ou situação datada dos pedidos ainda pendentes.
- ☐ **Peças externas sem placeholders** — `make release-check` verde (memorando, ofício e anexo preenchidos).
- ☒ **Quem assina/protocola** definido (Eduardo) e **canal** escolhido: **SMAMUS (principal)** + EPTC/SMMU e Subprefeituras Centro-Sul/Glória.

5. Depois do protocolo

1. Acompanhar a designação de canal técnico e a resposta de cada pedido LAI.
2. Compartilhar os agregados da sonda e os documentos que chegarem, quando solicitados.
3. Organizar vistoria técnica conjunta se a EPTC/SMMU a aceitar; os roteiros de campo servem de referência para essa etapa.

COMISSÃO VIÁRIA ESTRADA DAS TRÊS MENINAS

Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

Documento-síntese · versão institucional · 2026

Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a SMAMUS e a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavalhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavalhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro–centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Acompanhamos ainda um **nono ponto preliminar** — o entroncamento da Rua Santuário com a Av. Oscar Pereira, onde se formam filas para a conversão à esquerda em dias de maior fluxo — e **duas demandas adicionais de continuidade viária**: um **retorno seguro** no eixo da Estr. das Três Meninas e a **avaliação de capacidade** da Estr. Cristiano Kraemer. Ambas são apresentadas no anexo, como pontos a validar em vistoria.

Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (base oficial da EPTC, 2010–2026, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra **94 feridos graves e 8 vítimas fatais** no período — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. *(Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.)*
- **Fluidez.** Uma sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada em jul/2026) indica, no pico, **índice de duração estimada de ~1,3–1,4 no corredor da Av. Vicente Monteggia** e razão de **~2,0 entre os tempos estimados dos sentidos opostos R05/R06 no P7**. O índice compara estimativas com e sem considerar tráfego; a assimetria não isola o efeito da ausência da alça. *(Indicadores próprios, indicativos; a validar com contagens da EPTC.)*
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS; aplicação e transição a confirmar no texto final publicado).

Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência **e sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Além disso, a documentação oficial do licenciamento do empreendimento no eixo da Estr. das Três Meninas — reunida em jul–set/2026 a partir de respostas aos nossos pedidos de acesso à informação e de documentos disponibilizados pela administração do empreendimento — mostra que **boa parte do que aqui se pede já foi pactuada, projetada e aprovada pelo próprio Município, sem conclusão**:

- há um **Plano Funcional aprovado** para a Estr. das Três Meninas e um **Termo de Compromisso sem prazo de validade** (a cláusula que o limitava a 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012);
- o **Parecer CTAAPS nº 093/2020**, elaborado pelo Município, registra que **não foram implantadas** as segundas fases das interseções da Estr. das Três Meninas com a **Estr. Cristiano Kraemer (ponto 1)**, com a **Estr. Kanazawa e a R. Florestan Fernandes (ponto 6)** e com a **Estr. Costa Gama (ponto 7)**;
- **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias ao alargamento, inclusive a da **alça de ligação com a Estr. Costa Gama** (Decreto nº 20.860/2020), e outros dois (de 27/11/2020 e de 19/03/2024) alcançam parcelas vizinhas da mesma alça;
- o **projeto geométrico** dessa conexão, aprovado na CTAAPS em 2013, **perdeu a validade** (Decreto nº 20.659/2020) — e a própria **EPTC já recomendava, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido.

Ou seja: para vários pontos é possível **partir de soluções que a própria cidade já projetou e cujas áreas já declarou de utilidade pública** — a serem revalidadas, atualizadas às condições atuais e concluídas, não estudadas do zero. A resposta da PGM ao Pedido 9 já individualizou parte do quadro fundiário; a situação completa das intervenções segue sob apuração, e a confirmação financeira da Cláusula Nona foi remetida à **Secretaria Municipal da Fazenda**.

Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semafóricos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da SMAMUS e da EPTC/SMMU**, não substituí-la.

O que solicitamos


1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos (e do ponto preliminar);
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semafóricos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Acesso aos desenhos vigentes e ao status de implantação** do Plano Funcional da Estr. das Três Meninas, inclusive a conexão com a Costa Gama e os projetos complementares, com **avaliação de revalidação/atualização** das soluções já projetadas;
4. **Abertura de um canal de diálogo** com a SMAMUS e a EPTC/SMMU (com apoio das Subprefeituras Centro-Sul e Glória);
5. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.

Anexos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado.

Comissão Viária Estrada das Três Meninas — comissao.viaria@outlook.com

Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao ofício à SMAMUS (c/c EPTC/SMMU) e ao memorando. **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (base oficial da EPTC, 2010–2026; a base Dados Abertos POA, 2020–2025, é evidência auxiliar), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica da SMAMUS/EPTC/SMMU**.

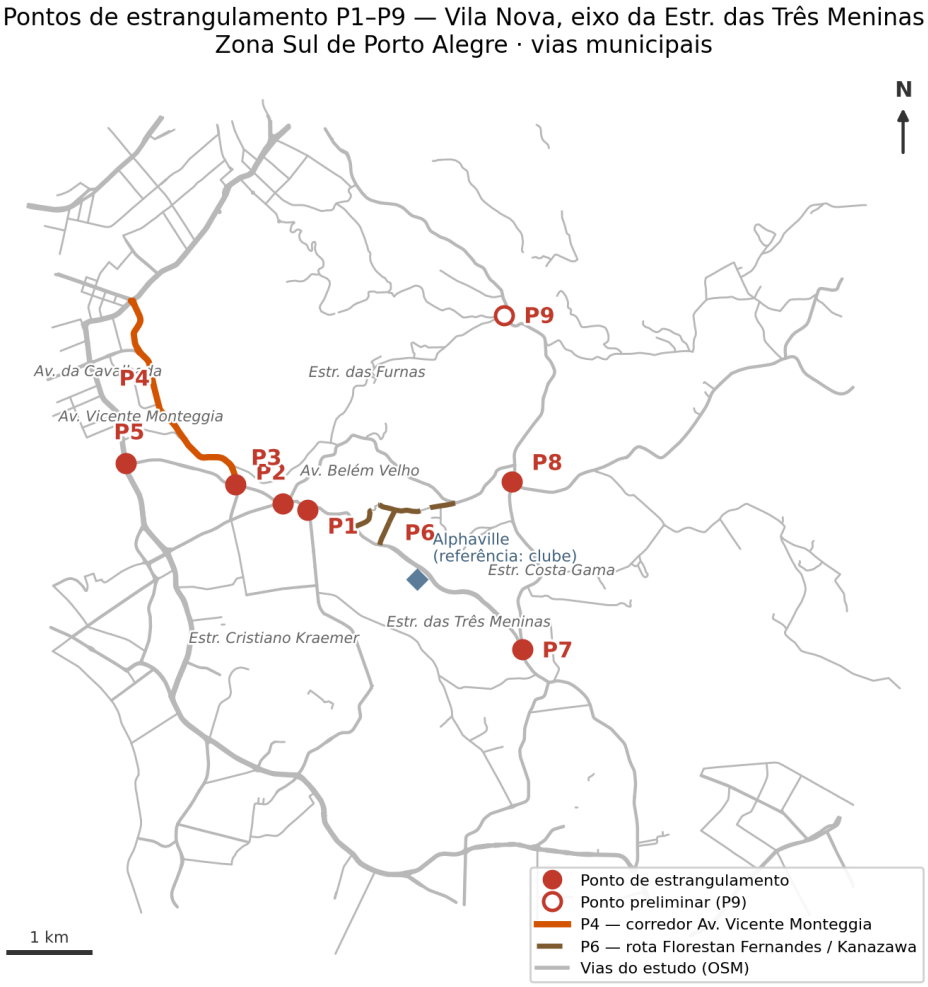

Pontos: dados/pontos.csv (cadastro canônico) · Malha: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Localização aproximada, a validar em campo · Gerado por scripts/gerar_mapa.py

Figura 1: Mapa dos pontos P1–P9 (localização aproximada, a validar tecnicamente)

Fichas dos pontos

P1 — Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer

Problema relatado: Estrangulamento e conflito na rótula.

Indícios e documentação: 58 sinistros (3 graves, 18 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~29 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; adequação prevista no Plano Funcional; **Parecer CTAAPS 093/2020: implantada só em 1ª etapa, projeto da 2ª fase não aprovado e falta o projeto de drenagem da adequação**; **sinalização viária também nunca aprovada** para a interseção — confirmado pela SMMU (Pedido 12, 16/09/2026), que não guarda cópias de projetos aprovados; **novo empreendimento (EU 002.308796.00.4, 287 U.A., Parecer CAUGE 048/2025) tem contrapartida viária aprovada**: TC obrigatório para alargamento, doação de recuo e sinalização junto à SMMU/EPTC.

Vistoria e encaminhamento: Aprovação do projeto da 2ª fase e da drenagem; geometria executada, velocidade e contagem direcional; **confirmar no TC/projeto se a contrapartida cobre a 2ª fase e a drenagem específicas de P1; execução e financiamento dessa solução ainda não demonstrados**.

P2 — Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo

Problema relatado: Conflito na confluência de três vias.

Indícios e documentação: 150 sinistros (14 graves, 50 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~58 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; **projeto de sinalização da Av. Monte Cristo concluído, implantação apenas parcial** — baias de ônibus paradas desde set/2024 (DCVU-SMSURB); **no nó do P2, o projeto implantado é da GPTC-EPTC e o processo foi encaminhado à EPTC para manifestação** (SMMU, resposta ao Pedido 5, 24/08/2026).

Vistoria e encaminhamento: Movimentos direcionais; **obter a manifestação da EPTC sobre o nó** (Pedido 5).

P3 — Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)

Problema relatado: Dificuldade/conflito de acesso.

Indícios e documentação: 136 sinistros (12 graves, 57 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~44 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo.

Vistoria e encaminhamento: Brechas de entrada, prioridade, contagem.

P4 — Corredor da Av. Vicente Monteggia (~2,9 km)

Problema relatado: Sobrecarga e gravidade no corredor.

Indícios e documentação: 1.648 sinistros, 94 graves, 8 fatais e 640 motos no corredor (base oficial da EPTC, 2010–2026); por trecho, **mais graves** entre Estr. João Vedana e Estr. João Passuelo (248 sinistros, 25 graves, 2 fatais), **mais fatais** entre Av. Otto Niemeyer e Estr. Aracaju (3) e **maior concentração** na ponta Cavalhada/Nonoai (494 sinistros, sobretudo no entroncamento); auxiliar: 409 sinistros e 2 fatais em 2020–2025, sem filtro de vítimas — ver nota abaixo; **sonda: índice de duração estimada ~1,3–1,4 no pico (p85 até ~1,9), conforme a rota e a janela**.

O S06 tem mais feridos graves; o S03, mais fatais; e o S01, na ponta da Cavalhada/Nonoai, a maior concentração de ocorrências (1.823 por km), provavelmente dominada pelo próprio entroncamento e com poucos graves — a validar em vistoria. Metodologia completa, scripts e dados em dados/tratados/acidentes_metodologia.md §Rodada 04.

Vistoria e encaminhamento: Contagem por trecho; velocidades; **vistoriar trechos prioritários**; **trechos prioritários pela base EPTC: S06, S03 e S01**.

P5 — Conversão Av. João Salomoni → Av. da Cavalhada

Problema relatado: Conversão problemática.

Indícios e documentação: Sinistralidade no entorno da Cavalhada; **311 sinistros (6 graves, 57 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026)**; auxiliar: ~71 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; **plano semafórico obtido via LAI: 13 planos por horário, ciclos de 55 a 130 s, 2 estágios** (Informação Técnica EPTC nº 40664080).

Vistoria e encaminhamento: Volume da conversão, travessia, ônibus; **confirmar se o movimento relatado tem fase dedicada**.

P6 — Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa)

Problema relatado: Rota precária (trecho não pavimentado).

Indícios e documentação: Precariedade física; **36 sinistros (2 graves, 15 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026)** — ainda pouco expressivo perto dos outros pontos (auxiliar: 8 em 2020–2025) — ver nota abaixo; + estudos dos dois acessos exigidos em 2013; **Parecer CTAAPS 093/2020: projetos de Kanazawa e Florestan Fernandes aprovados e "nenhuma foi implantada"**; **Decreto nº 20.859/2020 declarou a desapropriação** na esquina com a Kanazawa (1.806,73 m²). A PGM informa que a declaração **caducou em 28/12/2025** e que novo decreto é previsto a partir de dez/2026 (não antes de 29/12/2026), depois de **revisar o projeto** para excluir áreas já consolidadas como públicas; **a faixa do Decreto nº 20.861/2020, junto ao cruzamento com a Florestan Fernandes, também está em ação judicial (sem imissão provisória)**; **Parecer CAUGE 048/2025 confirma uma "Diretriz Viária da Estr. Kanazawa" vigente**, atingindo o novo empreendimento vizinho (EU 002.308796.00.4) por recuo viário.

Vistoria e encaminhamento: Novo decreto, efetivação da desapropriação e implantação dos projetos aprovados; largura, drenagem, calçadas e função de rede.

P7 — Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro–centro

Problema relatado: Sem conversão à esquerda; retorno distante.

Indícios e documentação: 67 sinistros (6 graves, 1 fatal em 2014, óbito posterior; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~18 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; **projeto geométrico aprovado na CTAAPS/2013 obtido via LAI — 1ª etapa + solução definitiva com conector a oeste — hoje caducado** (Dec. 20.659/2020); **a "alça de ligação" está nomeada no Decreto nº 20.860/2020, que declarou a desapropriação da área (1.334,07 m²)**; **PGM: imóvel do decreto desapropriado por acordo em 2025; as outras duas parcelas da alça têm decreto próprio — 20.808/2020, com escritura em nov/2025 e registro a confirmar, e 22.570/2024, em ação judicial desde jul/2026**; **2ª fase nunca implantada** (Parecer CTAAPS 093/2020); **sinalização viária nunca aprovada** para a nova interseção — confirmado pela EPTC, que orientou novo pedido à SMMU (Pedido 1→15); **sonda: R05/R06, sentidos opostos, têm razão ~2,0× no tempo e 1,6× na distância; comparação descritiva, sem isolar o efeito da alça**.

Vistoria e encaminhamento: Revalidar/atualizar o projeto (agora na **SMMU**); acompanhar a conclusão dos processos fundiários da alça (registro de uma escritura e uma ação judicial em curso), confirmar a situação física da área, o tempo do retorno e o volume.

P8 — Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Problema relatado: Filas no pico.

Indícios e documentação: 124 sinistros (11 graves, 44 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~36 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; **sonda: índice de duração estimada ~1,3 no pico (sentido Mariante→Costa Gama)**; **plano semafórico obtido via LAI: 15 planos por horário, ciclos de 55 a 160 s, 3 estágios** (Informação Técnica EPTC nº 40691572).

Vistoria e encaminhamento: Fila residual e volume por aproximação, agora com os tempos de verde oficiais como referência.

P9 *(preliminar)* — Entroncamento Rua Santuário × Av. Oscar Pereira

Problema relatado: Fila para a conversão à esquerda na Av. Oscar Pereira em dias de maior fluxo.

Indícios e documentação: 55 sinistros por proximidade (até 100 m; 6 graves, 1 fatal em 2014, 26 motos; base oficial da EPTC, 2010–2026); auxiliar: ~17 sinistros em 2020–2025 — ver nota abaixo; **novo ponto (reunião 13/08/2026), georreferenciado por pin**.

Vistoria e encaminhamento: Volume e brechas para a conversão à esquerda no pico; geometria, prioridade e travessia; contagem direcional.

Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária (até 100 m em interseções; corredor inteiro em P4 — escalas não comparáveis entre si, razão pela qual P4 é apresentado por trecho). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Em interseções sobre vias de tráfego intenso, parte das ocorrências no raio de 100 m pode pertencer ao corredor e não ao nó — é uma das validações solicitadas à EPTC. Os números da EPTC cobrem 16 anos e incluem ocorrências sem vítimas registradas: não interpretar diferenças entre pontos como tendência sem revisão caso a caso. Contato: Comissão Viária Estrada das Três Meninas — comissao.viaria@outlook.com.

Demandas adicionais de continuidade viária (preliminares, a validar). Além dos pontos acima, a comissão registra duas demandas de continuidade, apresentadas para avaliação técnica:

- **D2 — Retorno seguro no eixo da Estr. das Três Meninas.** Avaliar a implantação de um retorno que reduza percursos e manobras de risco — em linha, inclusive, com os **retornos no canteiro central** já previstos, em tese, no projeto do corredor. A validar quanto a localização, volume e segurança.
- **D3 — Avaliação de capacidade da Estr. Cristiano Kraemer** (trecho entre a rótula da Vila Nova e a Estr. das Três Meninas). Verificar, com contagens da EPTC, se a seção atual comporta a demanda — inclusive a decorrente dos **empreendimentos em licenciamento no eixo** —, dimensionando eventual ampliação de capacidade.

Evidência documental — obrigações pactuadas e projetos parados. Documentação oficial obtida em jul–ago/2026 (respostas LAI e documentos repassados pela administração do empreendimento) mostra que boa parte do que se pede **já foi pactuada, projetada e aprovada** pelo Município, sem conclusão: o Termo de Compromisso do licenciamento **não tem prazo de validade** (a cláusula de 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012); o **Parecer CTAAPS nº 093/2020** registra que as **2ªs fases das interseções com a Cristiano Kraemer (P1), a Kanazawa e a Florestan Fernandes (P6) e a Costa Gama (P7) não foram implantadas**; e **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias — inclusive a da **"alça de ligação" do P7** (Decreto nº 20.860/2020; o SEI mostrou depois mais dois decretos, de 27/11/2020 e 19/03/2024, para outras parcelas da mesma alça). A própria **EPTC recomendou, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido. Cronologia resumida em linha do tempo documental; detalhamento e fontes em projetos viários documentados.

Evidência de fluidez — sonda própria de tempos de viagem. Google Routes API: 8.582 medições em 14 rotas, de 04/07 a 01/09/2026; R13/R14 (P9) começaram em 14/08. Os agregados descrevem tempos estimados, assimetria entre sentidos e o índice `duration/staticDuration` (estimativa com tráfego dividida pela estimativa sem considerar tráfego). R05/R06, sentidos opostos no P7, apresentam razão aproximada de 2,0 no tempo e 1,6 na distância; isso não estima isoladamente o ganho de uma alça. Rankings da série inteira misturam janelas de coleta; o resumo da sonda apresenta também a janela comum. Não substitui contagens, validação espacial e medições da EPTC/SMMU.

Evidência de sinistros — base oficial da EPTC (Pedido 17, 22/09/2026). Em resposta ao Pedido 17, a EPTC disponibilizou sua **própria base de sinistros, 264.567 registros para todo o município (2010–2026)**, incluindo ocorrências sem vítimas registradas (como a base auxiliar). A comissão adotou essa base como **base oficial** de sinistros deste anexo (decisão de 24/09/2026). Os 9 pontos foram reprocessados com o método já usado no dossiê (associação por distância; limiares de 100 m/200 m em interseções e de 50 m/100 m em corredores e rotas). A base "Dados Abertos POA" (2020–2025, sem filtro de vítimas), usada desde a Rodada 02, permanece como **evidência auxiliar**:

Ponto	EPTC	Graves	Fatais	Motos	Auxiliar
P1	58	3	0	18	29
P2	150	14	0	50	58
P3	136	12	0	57	44
P4	1.648	94	**8**	640	409
P5	311	6	0	57	71
P6	36	2	0	15	8
P7	67	6	**1**	17	18
P8	124	11	0	44	36
P9	55	6	**1**	26	17

Os totais cobrem janelas diferentes: **EPTC 01/01/2010–09/09/2026; auxiliar 01/01/2020–31/08/2025**. Ambas incluem registros sem vítimas. A reconciliação na janela comum identifica diferenças de cobertura e coordenadas. Não interpretar os totais como tendência de segurança. "Graves" e "fatais" contam pessoas nos respectivos campos; "motos" conta veículos. Fatais inclui óbito no local e posterior; os óbitos de P7 e P9 registrados em 2014 estão fora da janela auxiliar.

Corredor da Av. Vicente Monteggia (P4), por trecho, na base da EPTC (o corredor inteiro não é comparável aos pontos de interseção; por isso o P4 é apresentado por trecho):

Trecho	Extensão	Sinistros	Graves	Fatais	Motos
S01	271 m	494	16	0	136
S02	402 m	158	14	0	68
S03	524 m	320	8	**3**	127
S04	277 m	122	12	1	70
S05	460 m	193	11	2	74
S06	710 m	248	**25**	2	116
S07	257 m	113	8	0	49

Identificação dos trechos: S01 Av. da Cavalhada / Nonoai → Av. Fábio Araújo Santos; **S02** → Av. Otto Niemeyer; **S03** → Estr. Aracaju; **S04** → Rua Amapá; **S05** → Estr. João Vedana; **S06** → Estr. João Passuelo; **S07** → Av. João Salomoni / Av. Rodrigues da Fonseca (cada trecho começa onde o anterior termina).
