

Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião — Comissão de Mobilidade

Comissão de Mobilidade — Moradores do Alphaville Porto Alegre

Julho de 2026

Guia de validação com a comissão + encaminhamento à EPTC

Caminho escolhido: protocolar com a evidência já disponível — sinistros, série da sonda e documentação oficial — e solicitar à EPTC os dados e a vistoria técnica que a comunidade não tem condições de produzir. Coleta física e questionário permanecem em espera por falta de mobilização e **não são condições do protocolo.**

1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** memorando institucional · rascunho de ofício · anexo de pontos.
- **Para abrir a reunião:** linha do tempo documental — uma página que mostra o que a cidade já pactuou, projetou e declarou no eixo da Três Meninas, e o que ficou parado. Boa forma de nivelar a comissão antes das decisões.
- **Técnico:** mapa dos pontos · matriz dos pontos (8 + P9) · avaliação das soluções · base de sinistros.
- **Evidência em consolidação:** sonda de tempos (12 rotas, dados brutos privados; agregar antes de circular) · capturas do trânsito típico · acompanhamento das LAIs.
- **Referências para a vistoria técnica:** plano de coleta · roteiro · ficha CSV.

2. Decisões da comissão (checklist)

- ☐ **Validar a lista de pontos** (8 + P9). Algum a remover, fundir ou incluir?
- ☒ **Grafia “Estr. Cristiano Kraemer”** — confirmada pela comissão.
- ☐ **Aprovar/editar** o texto do memorando externo e do ofício; preencher [nome / contato].
- ☐ **Destino de D2 (retorno) e D3 (alargamento):** manter **internas** até provar benefício público? (*recomendação: sim*)
- ☐ **P9 (Rótula da Vila Nova):** confirmar como ponto rastreado.
- ☐ **Quem assina e protocola**, e por qual canal (EPTC – Solicitações de Trânsito / Subprefeitura Centro-Sul).
- ☐ **Confirmar o encaminhamento:** protocolo baseado em sonda, sinistros e LAIs, com pedido explícito de dados e vistoria técnica da EPTC; coleta comunitária e questionário ficam em espera.

3. Consolidação antes da reunião de 13/8

- **Sonda:** verificar continuidade e gerar agregados por rota e horário: atraso versus fluxo livre, assimetria direcional no P4 e custo do retorno no P7. Declarar a janela de coleta e as limitações; não anexar nem publicar dados brutos da Google Routes API.
- **LAIs:** Pedidos 1, 4, 5 e 6 foram **prorrogados para 13/08** (mesmo dia da reunião) — incorporar à matriz de status as que já chegaram (2, 3, 7, possivelmente 8) e levar a reunião ciente de que o restante decide com evidência parcial. **O pedido 7 já respondeu (10/08):** confirma Waze desde 2019, aponta o portal ObservaMOB e traz os planos semaforicos oficiais de P5 e P8 — já no anexo.
- **Documentação da administração do Alphaville (recebida em 07/08):** já incorporada ao dossiê — TC integral, aditivos, **Parecer CTAAPS nº 093/2020** e **três decretos de desapropriação de 23/12/2020**. Mudou o enquadramento: o pleito passa a ser **concluir o que a cidade pactuou, projetou e declarou**, não pedir obra nova. **Decisão para a comissão:** protocolar os **Pedidos 9 (prioritário — prazo legal das desapropriações venceu em 23/12/2025) e 10**.
- **Peças:** atualizar o memorando e o anexo somente com fatos documentados e agregados, mantendo o pedido de validação técnica da EPTC.

4. Mínimo suficiente para protocolar na EPTC

Protocolar quando os requisitos formais abaixo estiverem cumpridos. A ausência de coleta física ou questionário não impede o pedido, que busca justamente a vistoria e os dados da autoridade competente.

- ☐ **Base indicativa consolidada:** sinistros, agregados metodologicamente descritos da sonda e respostas LAI — ou situação datada dos pedidos ainda pendentes.
- ☐ **Pecas externas sem placeholders** — `make release-check` verde (memorando, ofício e anexo preenchidos).
- ☐ **Quem assina/protocola** definido e **canal** escolhido (EPTC – Solicitações de Trânsito / Sub-prefeitura Centro-Sul).

5. Depois do protocolo

1. Acompanhar a designação de canal técnico e a resposta de cada pedido LAI.
2. Compartilhar os agregados da sonda e os documentos que chegarem, quando solicitados.
3. Organizar vistoria técnica conjunta se a EPTC/SMMU a aceitar; os roteiros de campo servem de referência para essa etapa.

COMISSÃO DE MOBILIDADE — MORADORES DO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE (VILA NOVA / ZONA SUL)

Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

Documento-síntese · versão institucional · 2026 · [campos entre colchetes a preencher pela comissão]

Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores do condomínio quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavallhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavallhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro-centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (Dados Abertos POA, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra feridos graves e vítimas fatais — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. (*Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.*)
- **Fluidez.** Uma sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada em jul/2026) indica, no pico, **atraso de ~1,3–1,4× no corredor da Av. Vicente Monteggia** e um custo de **2,0× no tempo do acesso legal à Estr. Costa Gama (P7)** frente ao movimento direto. (*Indicadores próprios, indicativos; a validar com contagens da EPTC.*)
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS, sancionado em 14/07/2026, com vigência 180 dias após a publicação).

Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das

melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência e **sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Além disso, a documentação oficial do licenciamento do Alphaville — reunida em jul-ago/2026 a partir de respostas aos nossos pedidos de acesso à informação e de documentos disponibilizados pela administração do empreendimento — mostra que **boa parte do que aqui se pede já foi pactuada, projetada e aprovada pelo próprio Município, sem conclusão**:

- há um **Plano Funcional aprovado** para a Estr. das Três Meninas e um **Termo de Compromisso sem prazo de validade** (a cláusula que o limitava a 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012);
- o **Parecer CTAAPS nº 093/2020**, elaborado pelo Município, registra que **não foram implantadas** as segundas fases das interseções da Estr. das Três Meninas com a **Estr. Cristiano Kraemer (ponto 1)**, com a **Estr. Kanazawa** e a **R. Florestan Fernandes (ponto 6)** e com a **Estr. Costa Gama (ponto 7)**;
- **três decretos de 23/12/2020** declararam de utilidade pública as áreas necessárias ao alargamento, inclusive a da **alça de ligação com a Estr. Costa Gama** (Decreto nº 20.860/2020);
- o **projeto geométrico** dessa conexão, aprovado na CTAAPS em 2013, **perdeu a validade** (Decreto nº 20.659/2020) — e a própria **EPTC já recomendava, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido.

Ou seja: para vários pontos é possível **partir de soluções que a própria cidade já projetou e cujas áreas já declarou de utilidade pública** — a serem revalidadas, atualizadas às condições atuais e concluídas, não estudadas do zero. O saldo das obrigações e a situação atual das desapropriações estão sendo apurados junto à **Procuradoria-Geral do Município**.

Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semafóricos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da EPTC/SMMU**, não substituí-la.


O que solicitamos

1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos;
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semafóricos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Acesso aos desenhos vigentes e ao status de implantação** do Plano Funcional da Estr. das Três Meninas, inclusive a conexão com a Costa Gama e os projetos complementares;
4. **Abertura de um canal de diálogo** com a EPTC/SMMU (com apoio da Subprefeitura Centro-Sul e demais instâncias territoriais pertinentes);
5. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.

Anexos sugeridos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado. Contato: [nome / e-mail / telefone da comissão].

Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao ofício à EPTC/SMMU e ao memorando. **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (Dados Abertos POA), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica da EPTC/SMMU**.

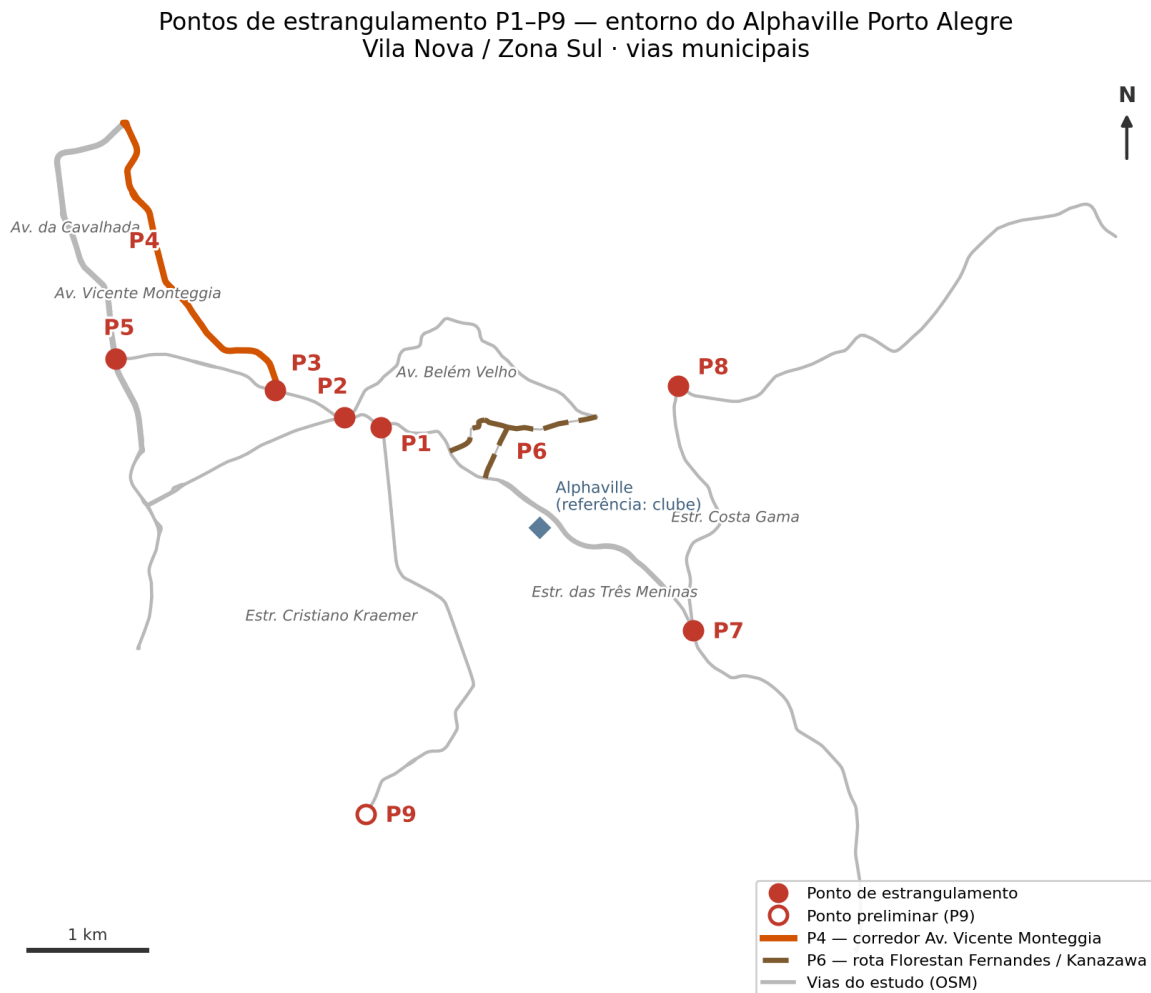

Pontos: dados/pontos.csv (cadastro canônico) · Malha: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Localização aproximada, a validar em campo · Gerado por scripts/gerar_mapa.py

Figura 1: Mapa dos pontos P1-P9 (localização aproximada, a validar tecnicamente)

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P1	Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer	Estrangulamento e conflito na rótula	~29 sinistros (4 graves) + adequação prevista no Plano Funcional; Parecer CTAAPS 093/2020: implantada só em 1ª etapa, projeto da 2ª fase não aprovado e falta o projeto de drenagem da adequação	Aprovação do projeto da 2ª fase e da drenagem; geometria executada, velocidade e contagem direcional
P2	Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo	Conflito na confluência de três vias	~58 sinistros (7 graves; motos)	Movimentos direcionais; sinergia com o projeto da Av. Monte Cristo
P3	Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)	Dificuldade/conflito de acesso	~44 sinistros (4 graves; motos)	Brechas de entrada, prioridade, contagem
P4	Corredor da Av. Vicente Monteggia (2,9 km)	Sobrecarga e gravidade no corredor	Sinistros graves e 2 fatais no corredor; trecho mais crítico entre Estr. João Vedana e Estr. João Passuelo (~67 sinistros, 9 graves, 1 fatal); tempos de viagem (sonda): o corredor mais lento, atraso ~1,3–1,4× no pico (p85 até ~1,9×)	Contagem por trecho; velocidades; vistoriar trechos prioritários

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P5	Conversão Av. João Salomoni → Av. da Cavallhada	Conversão problemática	Sinistralidade no entorno da Cavallhada; plano semafórico obtido via LAI: 13 planos por horário, ciclos de 55 a 130 s, 2 estágios (Informação Técnica EPTC nº 40664080)	Volume da conversão, travessia, ônibus; confirmar se o movimento relatado tem fase dedicada
P6	Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa)	Rota precária (trecho não pavimentado)	Precariedade física + estudos dos dois acessos exigidos em 2013; Parecer CTAAPS 093/2020: projetos de Kanazawa e Florestan Fernandes aprovados e “nenhuma foi implantada”; Decreto nº 20.859/2020 declarou a desapropriação na esquina com a Kanazawa (1.806,73 m ²)	Efetivação da desapropriação e implantação dos projetos aprovados; largura, drenagem, calçadas e função de rede

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P7	Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro—centro	Sem conversão à esquerda; retorno distante	~18 sinistros; projeto geométrico aprovado na CTAAPS/2013 obtido via LAI — 1ª etapa + solução definitiva com conector a oeste — hoje caducado (Dec. 20.659/2020); a “alça de ligação” está nomeada no Decreto nº 20.860/2020, que declarou a desapropriação da área (1.334,07 m²); 2ª fase nunca implantada (Parecer CTAAPS 093/2020); sonda: a rota legal (com o retorno) custa 2,0× o tempo e 1,6× a distância do movimento direto	Revalidar/atualizar o projeto; confirmar se a desapropriação foi efetivada (prazo legal vencido em 23/12/2025); tempo do retorno e volume

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P8	Cruzamento semafori- zado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariane	Filas no pico	~36 sinistros (4 graves; motos); sonda: atraso ~1,3× no pico (sentido Mari- ante→Costa Gama); plano semafórico obtido via LAI: 15 planos por horário, ciclos de 55 a 160 s, 3 estágios (Informação Técnica EPTC nº 40691572)	Fila residual e volume por aproximação, agora com os tempos de verde oficiais como referência
P9 (preli- mi- nar)	Rótula Estr. Cristiano Kraemer × Av. Juca Batista (conhecida localmente como “rótula da Vila Nova”)	Ajuste geométrico/moderação na rótula	~33 sinistros (1 grave; 8 motos) — dos quais 11 citam explicitamente o cruzamento; a dispersão dos demais indica contribuição do corredor da Av. Juca Batista	Geometria, velocidade, conflitos, pedestres; atribuição rótula × corredor

Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária (100 m em interseções; corredor inteiro em P4 — escalas não comparáveis entre si, razão pela qual P4 é apresentado por trecho). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Em interseções sobre vias de tráfego intenso, parte das ocorrências no raio de 100 m pode pertencer ao corredor e não ao nó — o caso é explícito no P9 e é uma das validações solicitadas à EPTC. Contato da comissão: [nome / e-mail / telefone].

Evidência documental — obrigações pactuadas e projetos parados. Documentação oficial obtida em jul–ago/2026 (respostas LAI e documentos repassados pela administração do empreendimento) mostra que boa parte do que se pede **já foi pactuada, projetada e aprovada** pelo Município, sem conclusão: o Termo de Compromisso do licenciamento **não tem prazo de validade** (a cláusula de 30 meses foi suprimida por aditivo em 2012); o **Parecer CTAAPS nº 093/2020** registra que as **2^{as} fases das interseções com a Cristiano Kraemer (P1), a Kanazawa e a Florestan Fernandes (P6) e a Costa Gama (P7) não foram implantadas**; e três decretos de 23/12/2020 declararam de utilidade pública as áreas necessárias — inclusive a da “**alça de ligação**” do **P7** (Decreto nº 20.860/2020). A própria **EPTC recomendou, em 2020, revisar os projetos** em razão do tempo decorrido. Cronologia resumida em linha do tempo documental; detalhamento e fontes em projetos viários documentados.

Evidência de fluidez — sonda própria de tempos de viagem (Google Routes API, série iniciada

em 04/07/2026, medindo 12 rotas nos picos e fins de semana): confirma o **corredor da Av. Vicente Monteggia (P4)** como o mais lento e mede o **custo do retorno distante do P7** — a rota legalmente disponível custa $2,0\times$ o tempo e $1,6\times$ a distância do movimento direto permitido. São **indicadores próprios, indicativos** — não substituem contagens e medições da EPTC/SMMU. Agregados em dados/tratados/sonda_tempos_resumo.md.
